工事名： 平成28年度 楢這トンネル舗装工事

# 実 施 工 程 表

請負者：世紀東急工業株式会社 東北支店

工 期 ： 自） 平成28年3月12日 至） 平成29年3月17日

作成日 平成29年1月31日

——— 計画 ——— 実施

| 工事種別 | | 単位 | 数量 当初 | 数量 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 準備工 | 現地路査、測量調査 | 式 | 1 | |
| 舗装工 | コンクリート舗装工（本線）<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>M-40 仕上り厚 228mm | m2 | 16,610 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>中間層(車道・路肩部)<br>再生密粒度As(13) t=40mm | m2 | 16,610 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>⑲-1 t=250mm | m2 | 14,970 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>⑲-2 t=250mm | m2 | 150 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>縦目地<br>縦突合せ目地 | m | 120 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>縦目地<br>側目地・中央帯側目地 | m | 5,970 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>横目地<br>膨張目地 | m | 40 | |
| | コンクリート舗装工（本線）<br>横目地<br>横突合せ目地 | m | 20 | |
| | コンクリート舗装工（監査廊）<br>中詰土<br>流用土、発生土 | m3 | 1,400 | |
| | コンクリート舗装工（監査廊）<br>路盤<br>RC-40 t=100mm | m2 | 2,760 | |
| | コンクリート舗装工（監査廊）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>② t=100mm | m2 | 2,820 | |
| | コンクリート舗装工（監査廊）<br>目地板<br>瀝青質目地板 t=10mm | m2 | 38 | |
| 排水構造物工 | 作業土工 | 式 | 1.0 | |
| | 側溝工<br>管（函）渠型側溝 | m | 2,936 | |
| | 集水桝・マンホール工<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 箇所 | 60 | |
| 中央分離帯工 | 中央分離帯工<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ版<br>② t=100mm | m2 | 1,450 | |
| | 中央分離帯工<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ<br>② t=50mm | m2 | 930 | |
| | 中央分離帯工<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ防護柵<br>1次ｺﾝ⑫ 24-3-20(高炉) | m | 1,452 | |
| | 中央分離帯工<br>ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ<br>② t=150mm | m2 | 520 | |
| | 中央分離帯工<br>ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ<br>ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製H=1300 | m | 40 | |
| 区画線工 | 区画線工<br>溶融式区画線 | m | 5,970 | |
| 配管工 | ｹｰﾌﾞﾙ配管工<br>ｹｰﾌﾞﾙ配管 | m | 1,482 | |
| 起点坑口 | 排水構造物工、擁壁工<br>防護柵工、橋梁附属物工 | 式 | 1.0 | |

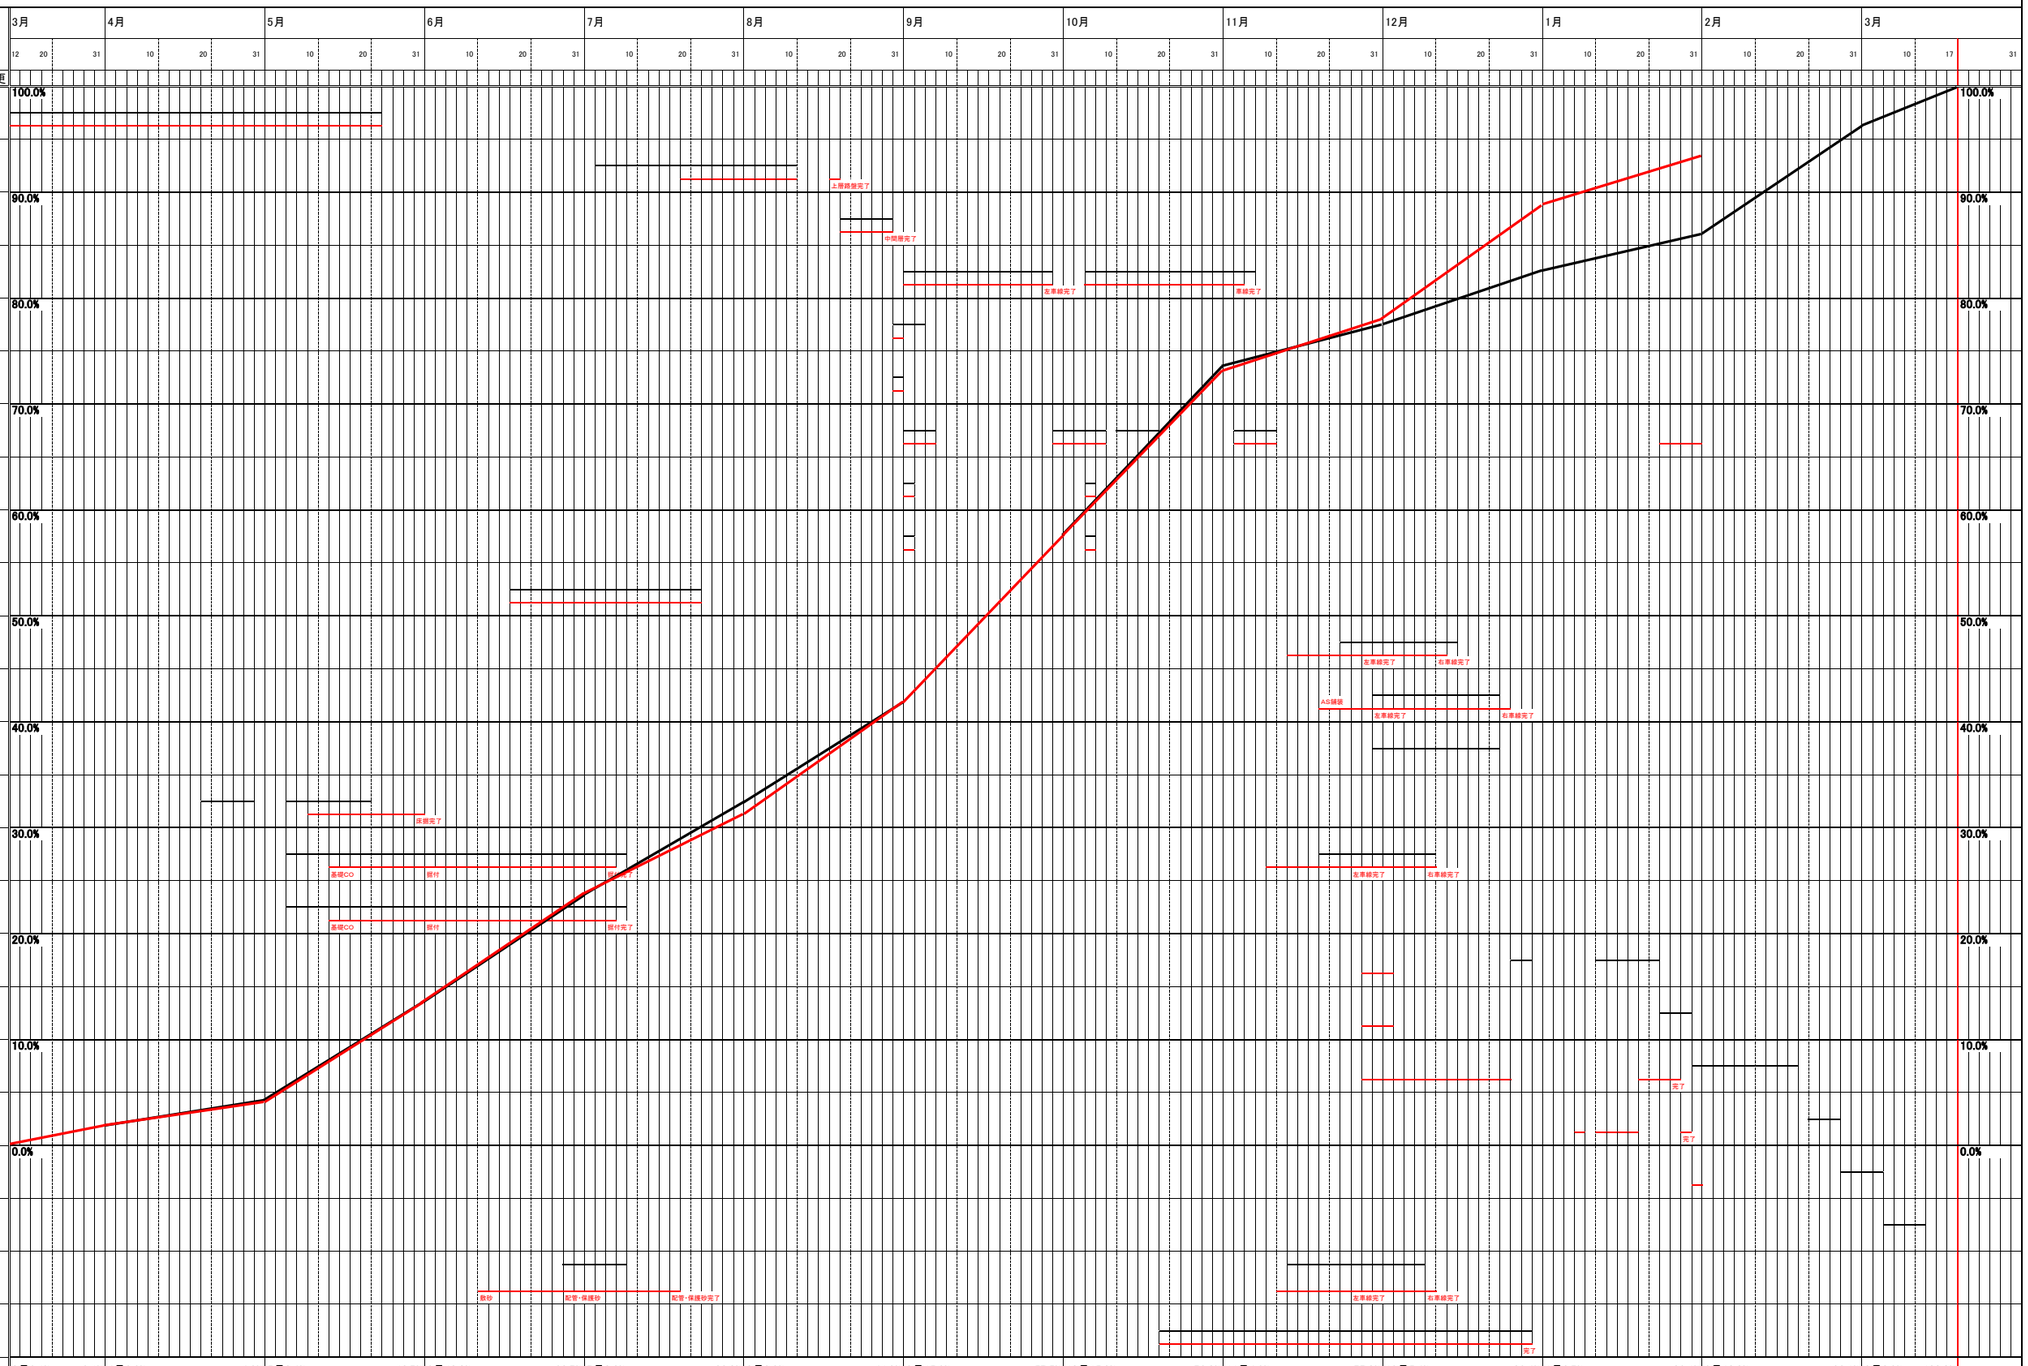


| 進捗率 | | |
